
Métricas e impedimentos — Sprint 2

Projeto: Feneme
Sprint: FT Sprint 2 | **Período:** 03/11/2026 a 12/11/2026 | **Release:** R2
Responsável pelo acompanhamento: Scrum Master
Fontes: Jira (quadro, histórico das issues e relatório nativo de Burndown), painel de Velocity do projeto e registros de testes, Pull Requests e CI no GitHub.
Situação deste registro: indicadores do quadro conferidos em 12/11/2026; validação formal dos aceites, da DoD e das decisões da Sprint Review ainda não documentada neste relatório.

1. Burndown da Sprint 2

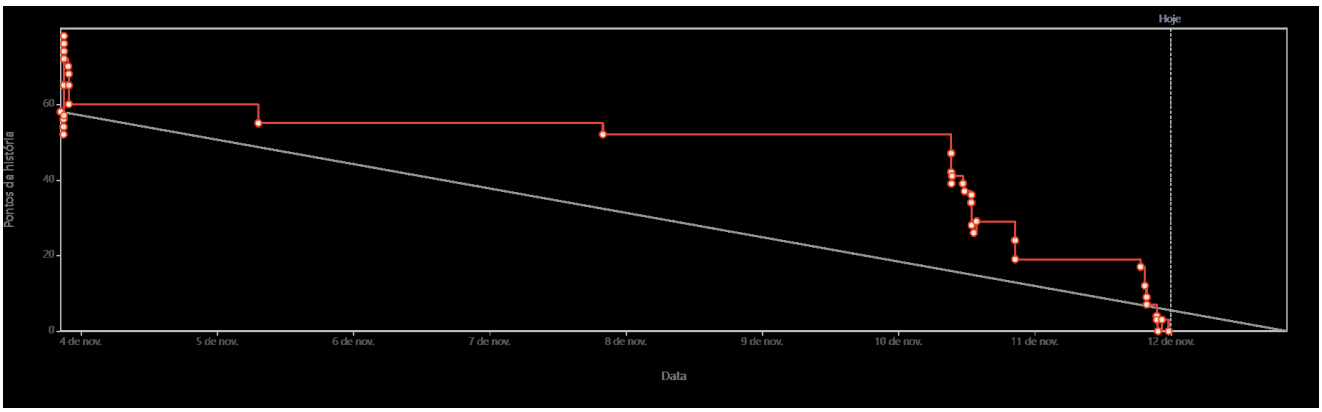

Fonte: Jira — "Gráfico de burndown do sprint", FT Sprint 2, campo "Pontos da história"; imagem obtida em 12/11/2026.

O gráfico apresenta a evolução dos Story Points restantes (linha vermelha) em comparação com a trajetória ideal (linha cinza). O trabalho registrado no Jira caiu principalmente nos últimos dias da sprint. Na captura de 12/11, a linha vermelha atinge **0 SP restantes**, de acordo com os status e as movimentações registrados no quadro naquele momento.


Interpretação: a queda no Burndown não representa, por si só, validação da Definition of Done (DoD): também podem afetar a curva alterações de escopo, estimativas e mudanças de status. A diferença entre o início da linha do relatório nativo e a reconstrução abaixo deve ser conferida no histórico de eventos do gráfico, sem presumir sua causa.

Alterações de escopo identificadas no histórico das issues

Evento	Data	SP	Observação
Conjunto de 11 issues inicialmente selecionadas	03/11	40	Soma das estimativas na reconstrução das issues; **não é o valor inicial validado do gráfico nativo**
Entrada da FT-58 (US-10)	10/11, 09h28	+2	Antecipada da Sprint 3
Entrada da FT-56 (US-07)	10/11, 12h53	+2	Antecipada da Sprint 3
Saída da FT-32	11/11, 19h26	−5	Transferida para a Sprint 3, não concluída na Sprint 2
Saída da FT-33	11/11, 21h45	−3	Transferida para a Sprint 3, não concluída na Sprint 2
Escopo nas 11 issues remanescentes	**12/11, consulta ao Jira**	**36**	**11 issues, todas com status Concluído**

A reconstrução de escopo resulta em **40 + 2 + 2 − 5 − 3 = 36 SP**. O gráfico oficial de Burndown apresenta uma linha inicial superior a essa reconstrução; portanto, **não se deve tratar os 40 SP como valor inicial confirmado pelo relatório nativo**. Para reconciliar completamente os números, é necessário conferir os eventos exibidos pelo Jira, sobretudo alterações de estimativas e escopo ocorridas durante o início da sprint.

2. Velocity da Sprint 2

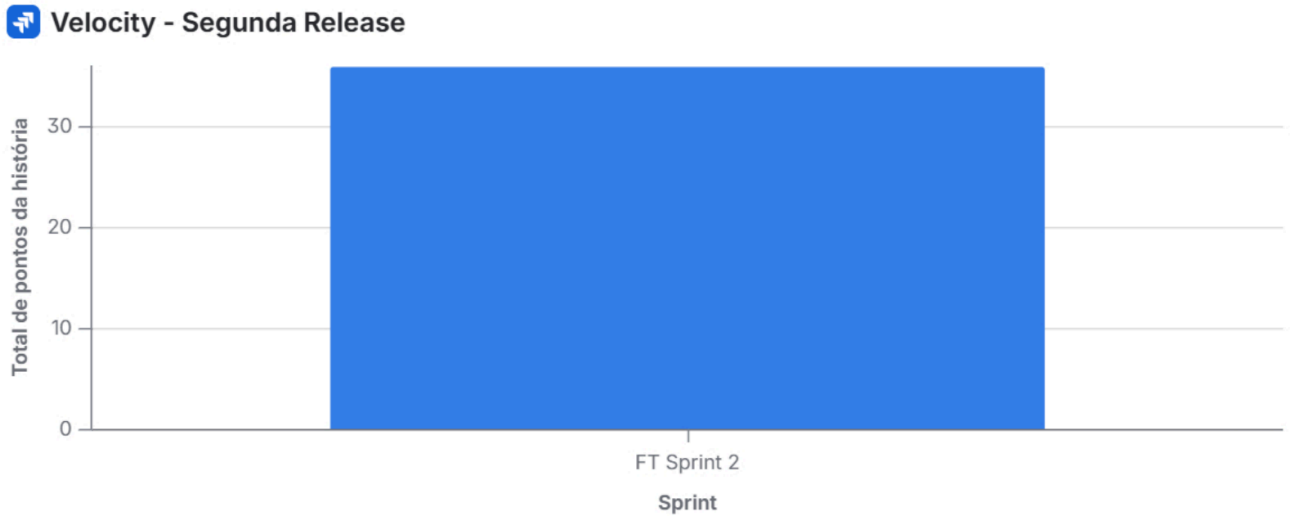

Fonte: Jira — widget "Velocity - Segunda Release", FT Sprint 2, imagem obtida em 12/11/2026.

O widget apresenta **36 Story Points** para a FT Sprint 2. A consulta ao quadro confirma que as **11 issues remanescentes somam 36 SP e estão marcadas como Concluídas**. Essa é a **velocity indicada pelo painel do Jira (por status)**, mas não deve ser confundida automaticamente com a **velocity homologada segundo a DoD**.

Indicador	Valor	Situação
Escopo remanescente após as movimentações	36 SP	Conferido nas 11 issues da Sprint 2
Pontos em status Concluído	36 SP	Conferido no quadro do Jira
Pontos restantes por status na captura	0 SP	Exibido no Burndown oficial
Histórias funcionais com aceite registrado do PO	12 SP	FT-46 (3), FT-47 (5), FT-56 (2) e FT-58 (2)
Desses pontos funcionais, com ressalva de aceite	2 SP	FT-58: PR #5 não teve aprovação prévia formal
Velocity formal validada pela DoD na Review	**Pendente**	**Requer decisão do PO e conferência da DoD**

Composição dos 36 SP no quadro

Issue	SP	Evidência ou ressalva principal
FT-36 — driver	3	Relacionada à usabilidade/Q-07; tempos sem cronometragem
FT-46 — US-06	3	Aceite do PO; PR #20
FT-47 — US-08	5	Aceite do PO após demonstração real; PR #23
FT-56 — US-07	2	Aceite do PO; PR #25
FT-58 — US-10	2	Aceita **com ressalva**; PR #5 sem revisão formal anterior
FT-62 — risco R03	2	Ações relativas a mensagens/logs e Q-06
FT-74 — Q-06	2	20/20 verificações de controle de acesso; 0 exposição relatada
FT-75 — Q-07	1	Resultado 5/5 aceito pelo PO; tempos não medidos com cronômetro
FT-87 — Scrum Master	3	**Concluída no Jira**, mas quatro itens da DoD seguem desmarcados
FT-88 — QA	5	Concluída no Jira, com itens de DoD sobre cenários e correção ainda desmarcados
FT-89 — PO/DevOps	8	Concluída no Jira, mas a DoD ainda pede decisões pós-Review e revisão do Plano de Releases
Total	**36**	**Total operacional, sujeito à validação formal da DoD**

Critério para fechamento: confirmar na Review quais itens serão contabilizados na velocity, os aceites e as ressalvas. Preservar, em paralelo, o indicador funcional de **12 SP aceitos pelo PO**, dos quais **2 SP com ressalva**. Não converter o status Concluído em evidência automática de atendimento à DoD.

3. Impedimentos e não conformidades acompanhados

Registro	Situação observada	Encaminhamento
Medição de usabilidade Q-07	Cinco participantes tiveram resultados registrados, mas os tempos não foram cronometrados.	Manter a limitação metodológica explícita; repetir a medição com cronômetro se a equipe ou a professora exigir.
Sprint Goal e escopo executado	O objetivo cita atualização de status das entregas; a FT-48/US-11 está planejada para a Sprint 3.	Registrar a divergência e a decisão do PO na Review.

4. Acompanhamento dos riscos R01 a R09

A FT-8 — Análise de Riscos e a planilha de riscos são as fontes oficiais detalhadas; este quadro resume apenas o acompanhamento conhecido, sem substituir a revisão da equipe.

Risco	Registro de acompanhamento	Situação de revisão
R01 — Acesso cruzado	Cenários de bloqueio relatados como aprovados; residual a confirmar	Conferência final pendente
R02 — Credenciais inválidas	Residual 15 → 10 registrado	Conferir/ratificar na revisão
R03 — Mensagens de erro e logs	Residual 12 → 8 registrado; relação com Q-06 e FT-62	Conferir/ratificar na revisão
R04 — Recomendação climática incorreta	Tratamento depende da recomendação de rotas	Acompanhar na Sprint 3
R05 — Persistência de status e histórico	Dependente da FT-48/US-11	Acompanhar na Sprint 3
R06 — Falha da Open--Meteo bloquear fluxo manual	Residual 16 → 8 registrado; testes de falha simulada	Reavaliar quando a recomendação estiver integrada
R07 — Justificativa da recomendação	Dependente da funcionalidade de recomendação	Acompanhar na Sprint 3
R08 — Passos excessivos no cadastro	Q-07 tem limitação de cronometragem	Reavaliar após evidência de usabilidade
R09 — Visualização móvel de status	Tratamento planejado para Sprint 4	Sem fechamento nesta Sprint 2

Nota: avaliações residuais registradas não equivalem a comprovação de que todos os nove riscos foram encerrados. Preservar os valores-base e registrar decisões da equipe/PO na planilha de riscos.

5. Análise e encaminhamentos para o fechamento

O progresso exibido no Burndown concentrou-se nos últimos dias, enquanto os dois gráficos do Jira indicam **0 SP restantes** e **36 SP em status Concluído** na captura de 12/11. O indicador de desempenho por status é positivo, mas a avaliação da sprint deve distinguir o andamento do quadro da aceitação efetiva, considerando DoD, ressalvas, alterações de escopo e alinhamento ao objetivo planejado.

Itens que dependem de confirmação documental após a Review/Retrospectiva:

- [ ] Confirmar data, horário, participantes e decisões reais da Review e da Retrospectiva; vincular as atas, se realizadas.
- [ ] Registrar o aceite final do PO por história e a convenção de contagem da velocity; manter as ressalvas de FT-58, FT-87, FT-88 e FT-89.
- [ ] Conferir os eventos do Burndown oficial e explicar a diferença entre sua abertura e a reconstrução de 40 SP.
- [ ] Atualizar o estado final do I-03 com evidências e responsáveis.
- [ ] Validar com a equipe o acompanhamento R01–R09 e os resultados Q-06, Q-07 e Q-13 (este último baseado em falhas simuladas).
- [ ] Publicar este documento com as duas imagens por Pull Request revisado e vincular o PR à FT-87.

Continuidade na Sprint 3: FT-90 (Scrum Master), FT-91 (QA) e FT-92 (PO/DevOps), conforme o escopo definido nas issues.

6. Referências

- FT-87 — Acompanhamento de Scrum Master
- FT-88 — Evidências de QA
- FT-89 — Registros de PO/DevOps
- FT-8 — Plano de Riscos
- FT-9 — Plano de Qualidade

- PR #14 — Planning, calendário e acordos da Sprint 2
- PR #18 — CT-22 e CT-23
- PR #24 — Testes simulados de falha na Open-Meteo
- PR #33 — Registro de usabilidade Q-07
